

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación


Demora en la elaboración de Planificación de Proyectos de Instalación de Equipos Telecomandados (ETC), por parte de la Empresa Contratista.

Área emitente: RI/US Emitido por: Jesús Irún Firma:  Fecha 26/10/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: RI/US

4- Análisis de las causas

Inexistencia de la programación de elaboración de Proyectos de Instalación de Equipos Telecomandados.

Nombre y Apellido del funcionario: Marcelino Bernal Firma:  Fecha: 26/10/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar programación de proyectos instalación de Equipos Telecomandados	AC	31/03/2023	RI/US	

Nombre y Apellido del funcionario: Marcelino Bernal Firma:  Fecha: 26/10/22

6- Acompañamiento


Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
(1)	(SI)	Correo electrónico: Coordinación Control de elaboración de Proyectos.

Fila es el SAM

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/10/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: José Jara

Firma:  Fecha: 26/10/22


7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No
Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cumplimiento: 24/10/23
Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor
Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia

Firma:  Fecha: 29/12/23

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Aldo Cantero

De: Carlos Alcaraz
Enviado el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 09:14 a.m.
Para: Aldo Cantero; Jesus Irun
Asunto: RV: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT
Datos adjuntos: 2do GRUPO_AS BUILT.xlsx; 20231024_074310.jpg

De: Carlos Alcaraz
Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 08:14
Para: 'Richard Mendez'
CC: Derlis Zolabarrieta; Carlos Pineda; Rodrigo Trinidad
Asunto: RE: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Buen día Ing. Richard:

En adjunto anexo planilla de los proyectos que necesitan ser corregidos correspondiente al segundo lote analizado, por lo que necesito que los mismo sean retirados en la mayor brevedad posible, además informar que el primer lote ya está como para ser retirado.

Atte.

ING. CARLOS ALCARAZ
Implementación del SGIDE (R/US)
ANDE - Dirección de Redes Inteligentes
Cel: +595 981 728389 - Int.: 6851
[Av. España 1093 e/ Pe. Cardozo y Washington
Barrio Las Mercedes - Asunción

De: Richard Mendez [<mailto:richard.mendez@aesa.com.py>]
Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 11:38
Para: Carlos Alcaraz
CC: Derlis Zolabarrieta; Carlos Pineda; Rodrigo Trinidad
Asunto: RE: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Estimado Ing. Carlos,

Recibido y conforme conversado agrego en copia a Rodrigo Trinidad y Carlos Pineda para trabajar en ello,

Vamos a verificar y estaremos remitiendo la información.

Saludos.

Richard Mendez
División de Proyectos en Ejecución.
Teléfono/Phone: +595 21 674524.
Móvil/Mobile: +595 985130627.

Estimado Ing Carlos,

Recibido y conforme conversado agregó en copia a Rodrigo Trinidad y Carlos Pineda para trabajar en ello,

Saludos.

Richard Mendez

División de Proyectos en Ejecución.

Teléfono/Phone: +595 21 674524.

Móvil/Mobile: +595 985130627.

Dirección/Address: Avda. Madame Lynch Nro. 627. Asunción – Paraguay.

www.aesa.com.py

AESA

ATENAS ENERGÍA S.A.

De: Carlos Alcaraz <carlos_alcaraz@ande.gov.py>

Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 11:21

Para: Richard Mendez <richard.mendez@aesa.com.py>

CC: Derlis Zolabarrieta <derlis_zolabarrieta@ande.gov.py>

Asunto: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Buen día estimado Ing. Richard:

Como ya conversado, en adjunto anexo planilla de los proyectos que necesitan ser corregidos y el listado de los que no pudimos ubicar en el primer lote analizado, por la que solicito me puedan enviar en la mayor brevedad posible, de tal manera a poder cerrar este primer lote.

Estaré atento a cualquier consulta si lo hubiere.

Atte.

ING. CARLOS ALCARAZ

Implementación del SGTDE (RI/US)

ANDE - Dirección de Redes Inteligentes

Cel: +595 981 728389 – Int.: 6851

Av. España 1093 e/ Pe. Cardozo y Washington

Barrio Las Mercedes - Asunción

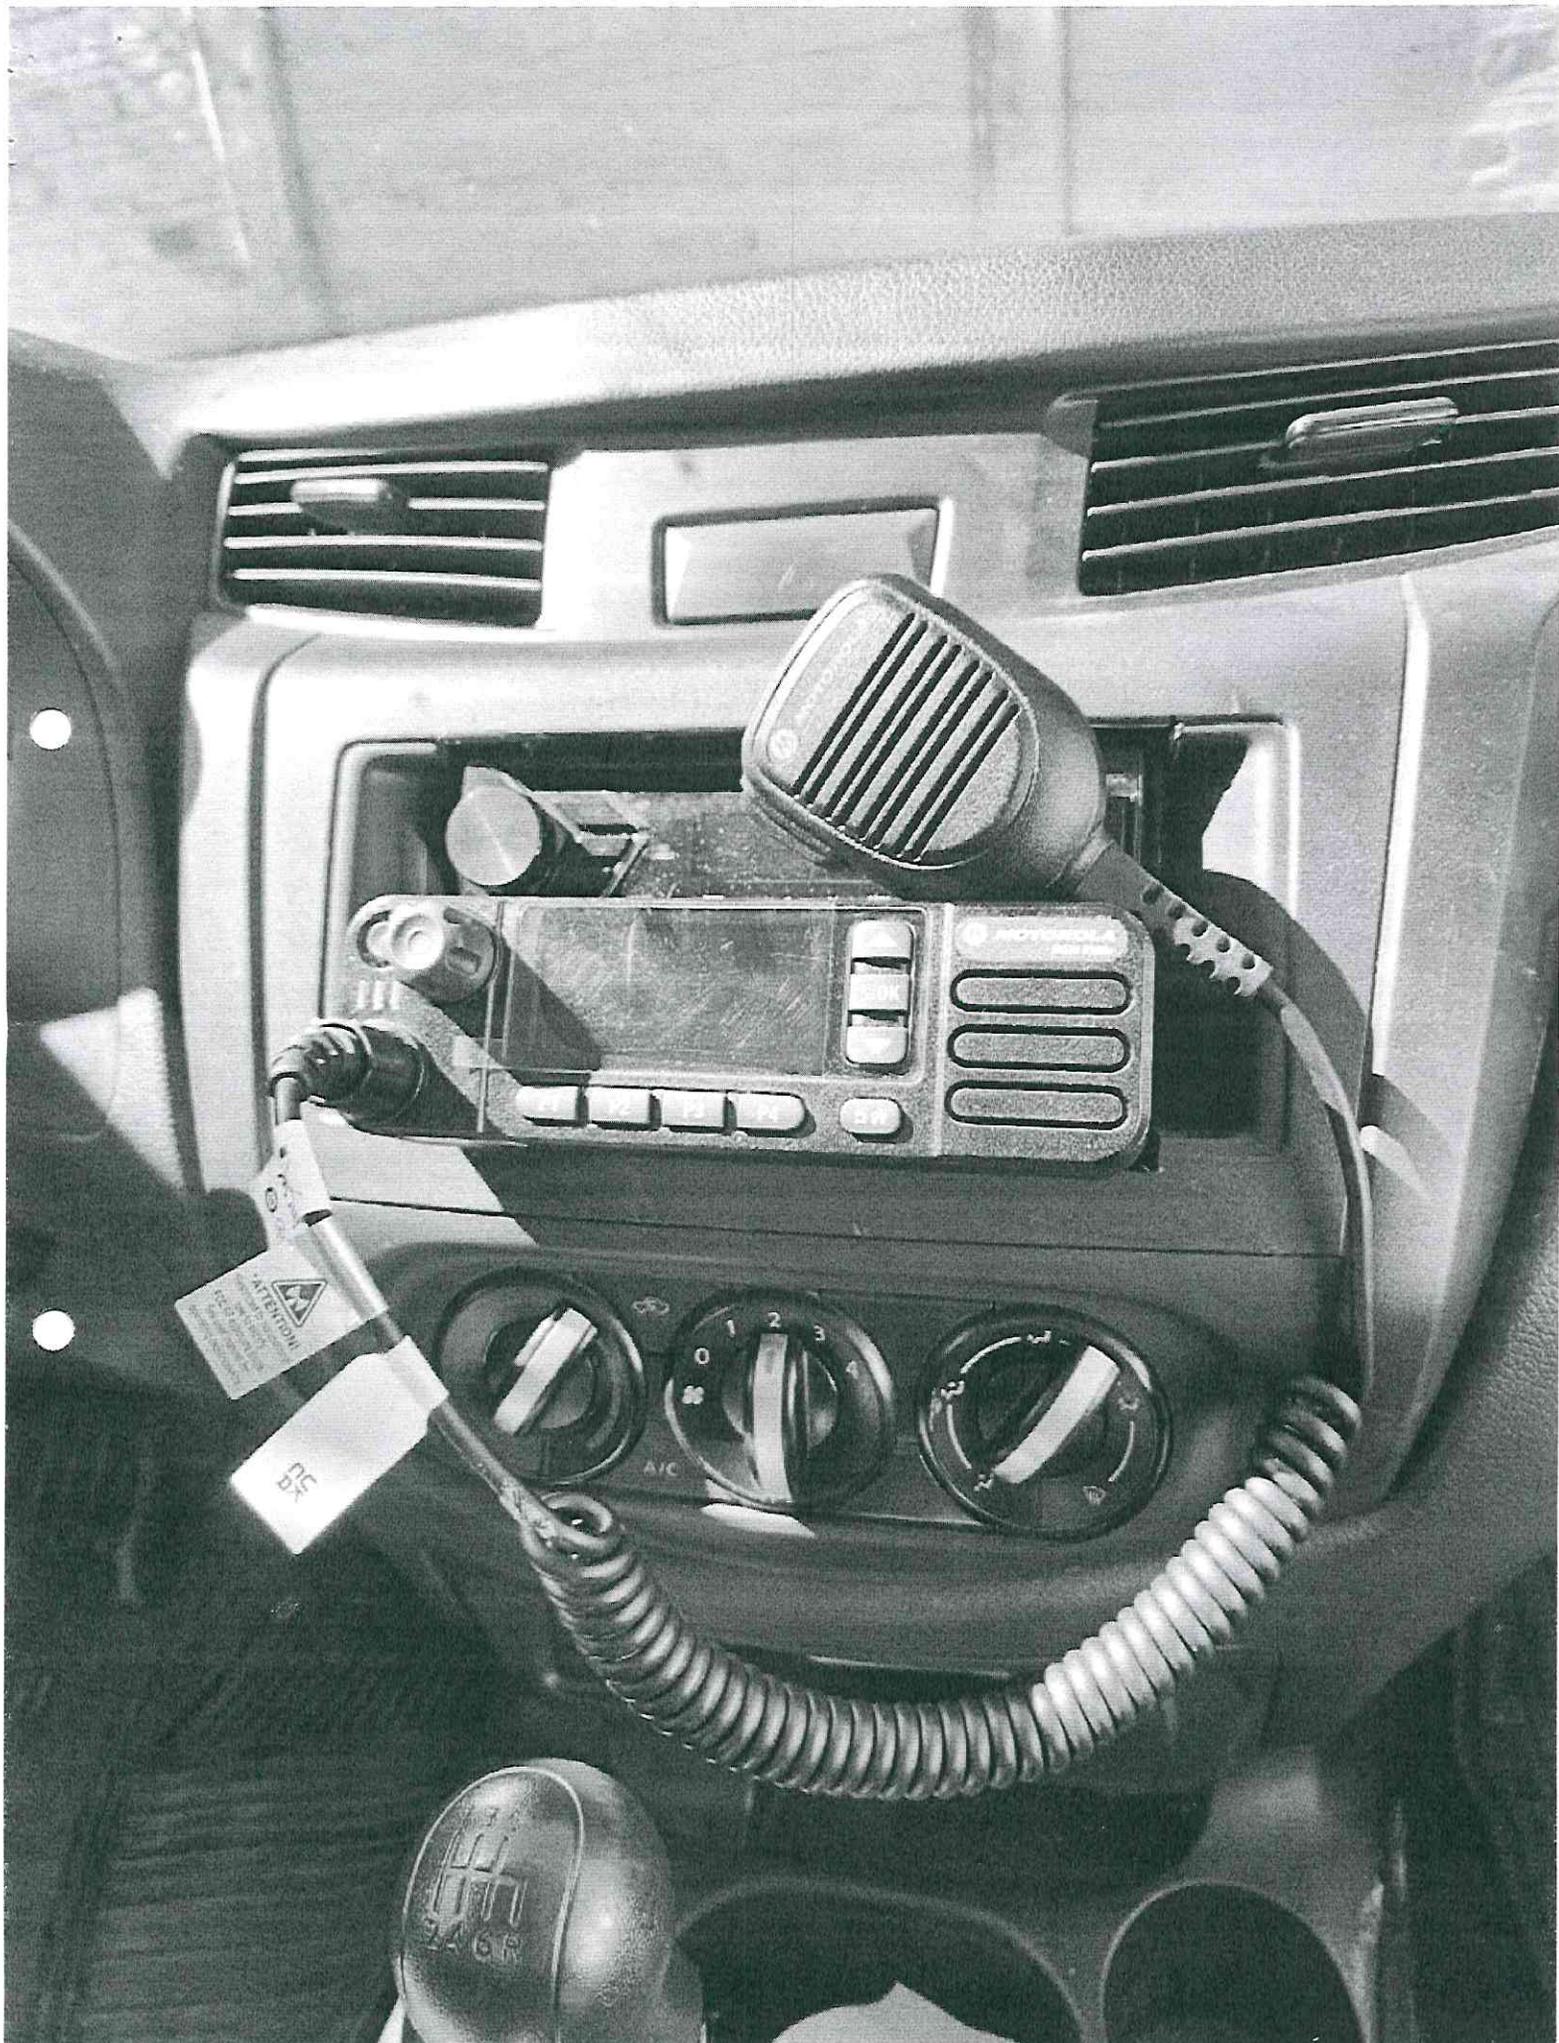
El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.



1662

0.70







MOTOROLA

Program
DORD Boggiani
SI-Z N/A N/A N/A

P1 P2 P3 P4

032
2012

martes, 12



Tape Ruvicha

1558



PARAGUAY
HFA 123

NGER

